



Chers fondateurs,
chers amis de Villemont,

Le début de printemps a été consacré à la finition de la couverture du colombier. La découpe des tuiles d'arêtes et leur ajustement (cf lettre n° 12) a demandé presque une semaine par arêtier, et a donc mobilisé le mois d'avril. L'étanchéité du lanternon en zinc vieilli a été réalisée en mai puis sa mise en peinture. Il ne manque plus que la pose du « chapeau » pour parvenir à l'achèvement de l'ouvrage.

Après quoi l'échafaudage sera déposé puis dressé le long de la façade du château que nous allons – enfin – pouvoir commencer à « étrésillonner » (étalement des baies par des pièces de bois croisées). Avant de commencer les travaux de purge des maçonneries dégradées. Puis reconstruire.

Il nous a fallu aussi nous préoccuper de faire un abri à la débiteur/tailleur de pierres, livrée en mars dernier. Deux mois auront été nécessaires à sa réalisation. Dès l'hiver, une fois alimenté en eau et électricité (380V), ce local sera opérationnel pour la taille des pierres de jambage et linteaux de la façade.

Et puis nous avons continué à agrémenter le parc : la Cour d'honneur s'embellit de ses ifs taillés (ci-dessus), la charmille de l'entrée prospère, et les semis de gazon de l'an dernier s'étoffent (ci-dessous). Nous avons aussi - coté parc, de l'autre côté des bâtiments - travaillé les terrassements de part et d'autre des talus de la plateforme. Et planté quelques tilleuls d'alignement. (photos à voir seulement dans la prochaine lettre).



travaux en vert

Les tâches de printemps n'ont donc pas manqué pendant ces trois derniers mois : à finir la mise en forme de la cour d'honneur, à achever les deux quarts de lune qui bordent l'allée d'arrivée, et à organiser la pousse des deux charmilles à l'état naissant qui les agrémentent.



les parterres d'herbe de la cour d'honneur

vue déformée, mais évocatrice, des communs Sud et de la charmille



La précédente lettre évoquait la livraison d'une «débiteuse» (scie à eau). Voici son installation :



Emplacement du futur atelier de taille de pierres

l'atelier de taille de pierres



Scie à eau (bâchée) en place et ossature en cours



L'atelier de pierres de taille a été installé à l'arrière des bâtiments, au Nord, dans le prolongement des cuisines : Cet emplacement a été choisi pour sa double proximité

avec le lieu de stockage des pierres et le château proprement dit qui est la partie des bâtiments où l'utilisation des pierres taillées sera la plus forte.





Finition de charpente/couverture

étanchéité du lanternon du colombier Est

Le lanternon n'est pas accessible : il n'y a pas de trappe depuis le colombier.

Son étanchéité a été réalisée avec des caissons zinc en triangles, posés entre tasseaux lesquels sont ensuite coiffés chacun de couvre joints.

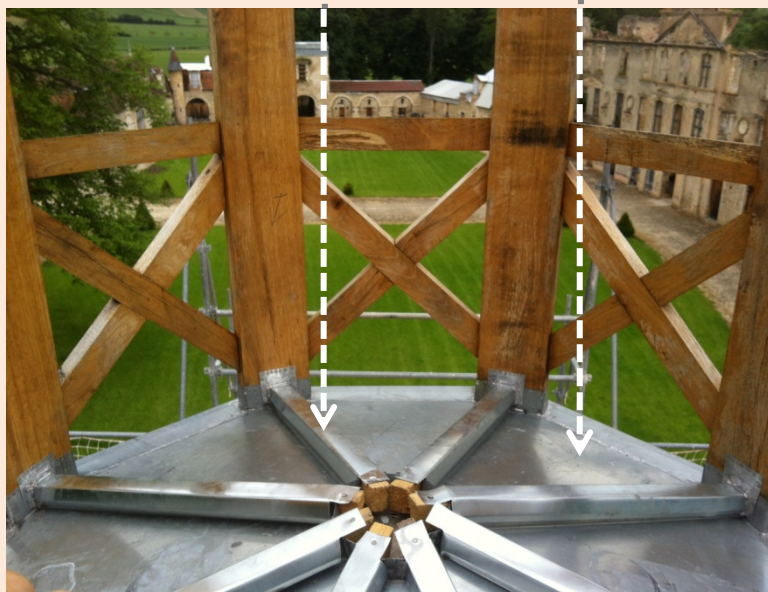

Les poteaux du lanternon sont aussi habillés de zinc. Quant à la partie basse, en limite de couverture, elle reçoit un solin, fixé à clous fins et jointifs. Quelques tuiles finiront le dernier rang.

Suite ... **la lettre n°14** (octobre 2013)
